

VibeFlow

Sprint 1: Review & Retrospective Report

Sprint 1: 28 Maggio – 4 Giugno 2026

Gruppo 6

Autorino Luigi

Chirico Emanuel

Crisci Chiara

Graziuso Emanuela

Prof. Andrea Apicella

Prof. Pierluigi Ritrovato

1. Informazioni Sprint

Campo	Dettaglio
Progetto	VibeFlow
Sprint N°	1
Data inizio	28/05/2026
Data fine	04/06/2026
Team	Autorino Luigi, Chirico Emanuel, Crisci Chiara, Graziuso Emanuela
Professori	Apicella Andrea, Ritrovato Pierluigi

2. Sprint Goal

Implementare le funzionalità fondamentali di gestione delle tracce e delle playlist all'interno dell'applicazione VibeFlow, incluse la creazione, modifica, eliminazione e visualizzazione degli oggetti Track e Playlist.

3. User Stories — Stato al termine dello Sprint

ID_US	Task	Assegnatario	Data inizio	Data fine prevista	Data fine	Priorità	Stato	Story points
Sprint 1								
ID_1	Crea Track	Chirico Emanuel	29/5	31/5	31/5	High	Completed	3
ID_2	Modifica Track	Crisci Chiara	29/5	1/6	1/6	High	Completed	1
ID_3	Rimuovi Track	Crisci Chiara	29/5	1/6	1/6	High	Completed	1
ID_4	Visualizza Libreria Track	Graziuso Emanuela	29/5	2/6	1/6	High	Completed	3
ID_5	Crea Playlist	Autorino Luigi	29/5	31/5	31/5	High	Completed	3
ID_6	Aggiungi Track a Playlist	Graziuso Emanuela	29/5	1/6	3/6	High	Completed	3
ID_7	Rimuovi Track da Playlist	Graziuso Emanuela	29/5	1/6	3/6	High	Completed	1
ID_8	Elimina Playlist	Graziuso Emanuela	29/5	2/6	3/6	High	Completed	1
ID_9	Riproduci Track e Playlist	Chirico Emanuel	29/5	3/6	2/6	High	Postponed	5
ID_10	Sospendi / Riprendi Riproduzione	Crisci Chiara	29/5	4/6	2/6	High	Completed	5
ID_11	Skip Track	Autorino Luigi	29/5	3/6	2/6	High	Postponed	5
ID_24	Rinomina Playlist	Crisci Chiara	29/5	2/6	3/6	Low	Completed	1

4. User Stories non completate

4.1 Motivi del mancato completamento

Le seguenti user story sono state posticipate al prossimo sprint:


ID	Task	Motivazione
ID_9	Riproduci Track / Playlist	Il task [ID_9] accorpava due feature distinte (riproduzione singolo brano e riproduzione intera playlist). Questo ha portato a una parziale implementazione, in quanto la logica per la riproduzione dell'intera playlist richiedeva più sforzo del previsto, nello specifico la realizzazione di una UI dedicata e di una modalità di esecuzione, attività pianificate per lo sprint successive. Pertanto, nonostante la logica di riproduzione è stata correttamente implementata, nel suo complesso non è stato possibile ritenere tale task concluso.
ID_11	Skip Track	Il task [ID_11] non è stato completato in questa sprint a causa di una mancata suddivisione atomica di esso. Infatti, il completamento di questo richiedeva componenti pianificati per lo sprint successivo. A causa di questa dipendenza, dunque, è stato necessario posticipare il completamento di questo task, di cui mancanti due story points, allo sprint successivo.

5. Sprint Burndown Chart

La tabella seguente riporta i dati del burndown chart per lo Sprint 1. Il team ha mantenuto un ritmo di lavoro sostanzialmente in linea con la pianificazione fino al giorno 5, con una lieve deviazione negli ultimi giorni dovuta ai task posticipati.

Sprint 1 Burndown Chart

Giorno	SP Da Completare	SP Pianificati
1	32	32
2	32	32
3	26	26
4	21	22
5	10	15
6	4	5
7	4	0

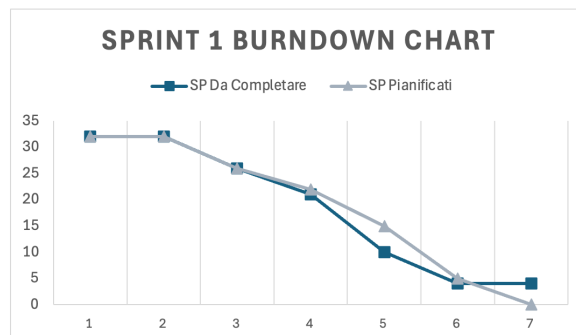

Nota: Al giorno 7 risultano ancora 4 SP non completati (ID_9 e ID_11 posticipati al prossimo sprint). Il valore pianificato di 0 rappresentava il completamento ideale di tutti i task.

6. Metriche di Sprint

Metrica	Valore Pianificato	Valore Effettivo
Story Points completati	32	28
User Stories completate	12	10 / 12
Velocity sprint corrente	32	28
Task posticipati (Postponed)	0	2
Story Points posticipati	0	4

La **velocity** dello sprint non è linea con quanto previsto: si è riscontrato un effort maggiore rispetto a quello previsto. La motivazione risiede nella mancata atomicizzazione dei task che hanno richiesto lo sviluppo di logiche non previste inizialmente nella divisione del task.

7. Sprint Retrospective

A valle delle considerazioni emerse durante il meeting di review, il team ha identificato i seguenti comportamenti da continuare, evitare e migliorare nel prossimo sprint:

Start	More of	Keep doing	Less of	Stop
Sessioni di atomicizzazione dei task in modalità Cross-Functional.	Continuare con la discussione proattiva al fine di migliorare la qualità del prodotto.	Disponibilità immediata tra compagni di sviluppo quando c'è un blocco.	Inizio solitario delle attività. Bisogna ridurre a zero l'attesa passiva e coordinarsi meglio.	Trattenere task completati in locale o rimandare i merge per evitare conflitti.
Vincolare la stima degli SP al confronto con lo storico della Velocity (32) per evitare sovraccarichi o sottostime.		Testare frequentemente il sistema per individuare bug.		Svolgere macro-tasks senza pensare a suddividerli internamente.
		Ritmi di lavoro costanti e produttività.		Assegnare task che richiedono componenti pianificati per altre sprint per l'implementazione.

8 Prossimo Sprint — Pianificazione Preliminare

Obiettivo del prossimo Sprint

Il focus del prossimo sprint è sullo sviluppo delle modalità avanzate del player (riproduzione sequenziale, shuffle, loop), il completamento dei task posticipati (ID_9, ID_11), l'aggiornamento real-time dell'interfaccia del media player e la cura della UI/UX. Il team si impegna inoltre a migliorare la fase di planning con una decomposizione più granulare dei task e una gestione esplicita delle dipendenze inter-task.
