

VibeFlow

Sprint 2: Review & Retrospective Report

Sprint 2: 4 Giugno – 11 Giugno 2026

Gruppo 6

Autorino Luigi

Chirico Emanuel

Crisci Chiara

Graziuso Emanuela

Prof. Andrea Apicella

Prof. Pierluigi Ritrovato

1. Informazioni Sprint

Campo	Dettaglio
Progetto	VibeFlow
Sprint N°	2
Data inizio	04/06/2026
Data fine	11/06/2026
Team	Autorino Luigi, Chirico Emanuel, Crisci Chiara, Graziuso Emanuela
Professori	Apicella Andrea, Ritrovato Pierluigi

2. Sprint Goal

Completare le funzionalità posticipate dalla prima Sprint: riproduzione traccia e playlist. Rilasciare le funzionalità di base ed avanzate del media player con l'aggiornamento real-time dell'interfaccia. Fornire un'interfaccia grafica ottimizzata con funzione di annullamento (undo).

3. User Stories — Stato al termine dello Sprint

ID_US	Task	Assegnatario	Data inizio	Data fine prevista	Data fine	Priorità	Stato	Story points
Sprint 2								
ID_11	Skip Track	Autorino Luigi	6/6	7/6	6/6	High	Completed	5
ID_12	Riproduzione sequenziale	Autorino Luigi	6/6	8/6	6/6	High	Completed	3
ID_25	Progettazione GUI	Autorino Luigi	4/6	6/6	5/6	High	Completed	5
ID_13	Riproduzione 'Shuffle'	Crisci Chiara	6/6	8/6	7/6	High	Completed	3
ID_14	Riproduzione 'Loop'	Graziuso Emanuela	6/6	8/6	7/6	High	Completed	3
ID_15	Aggiornamento Real-Time Player	Crisci Chiara	6/6	9/6	7/6	High	Completed	5
ID_16	Undo Aggiunta Traccia	Graziuso Emanuela	6/6	10/6	7/6	Medium	Completed	2
ID_17	Undo Rimozione Traccia	Graziuso Emanuela	6/6	10/6	7/6	Medium	Completed	2
ID_9	Riproduci Track e Playlist	Chirico Emanuel	7/6	8/6	8/6	High	Completed	3
ID_26	Creazione tracce '.mp3'	Chirico Emanuel	5/6	6/6	6/6	High	Completed	5
ID_27	Riproduzione tracce '.mp3'	Chirico Emanuel	6/6	7/6	7/6	High	Completed	3

4. User Stories Aggiunte

Durante lo Sprint 2, a seguito di una serie di confronti interni e di un'attenta analisi incentrata sull'esperienza utente, il team ha identificato la necessità di integrare tre nuove User Stories (ID_25, ID_26 e ID_27) all'interno del product backlog. Questa scelta strategica è nata dall'esigenza di non limitare i test a dati simulati, fornendo invece un incremento di prodotto realistico, coerente nell'interfaccia e immediatamente testabile con file multimediali effettivi.


ID_US	Titolo Task	Motivazione dell'Inserimento
ID_25	Progettazione GUI	Garantire la coerenza visiva e l'integrità dell'applicazione. È stato introdotto un design system uniforme con tema coerente per tutte le schermate.
ID_26	Creazione tracce '.mp3'	Superare la simulazione di dati fittizi. Permette all'utente di popolare la propria libreria caricando file musicali reali. Include la validazione dei form, l'esplorazione del FileSystem locale e l'estrazione automatica della durata.
ID_27	Riproduzione tracce '.mp3'	Abilitare il core del software. Sostituisce il vecchio sistema di riproduzione simulato con un motore audio reale.

5. Sprint Burndown Chart

Il burndown chart della Sprint 2 mostra un andamento positivo e in linea con gli obiettivi pianificati. Il team ha completato tutti i 39 Story Points previsti entro il giorno 5, con dei giorni di anticipo rispetto alla fine dello sprint. La linea reale scende costantemente al di sotto della linea ideale a partire dal giorno 2, evidenziando una velocità di consegna superiore alle aspettative. Lo sprint si è concluso senza Story Points residui, confermando il pieno raggiungimento dello Sprint Goal.

Sprint 2 Burndown Chart

Giorno	SP Da Completare	SP Pianificati
1	39	39
2	36	39
3	23	29
4	3	21
5	0	9
6	0	4
7	0	0

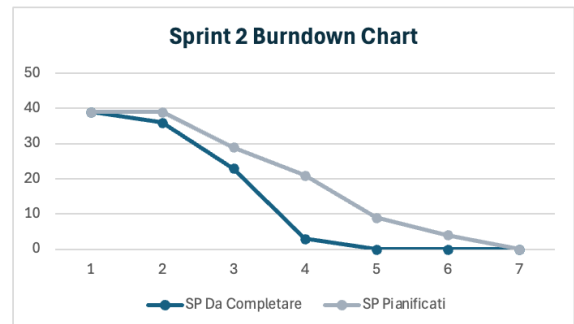

6. Metriche di Sprint

Metrica	Valore Pianificato	Valore Effettivo
Story Points completati	39	39
User Stories completate	11	11/11
Velocity sprint corrente	39	39
Task posticipati (Postponed)	0	0
Story Points posticipati	0	0

La **velocity** effettiva della Sprint 2 (39 SP) risulta in netto miglioramento rispetto alla Sprint 1, con il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi pianificati e nessun task posticipato. Il miglioramento è attribuibile a una pianificazione più granulare dei task, a una gestione esplicita delle dipendenze inter-task — azioni identificate già nella retrospettiva della Sprint 1 — e alla maggiore familiarità del team con il processo di sviluppo e con la codebase esistente.

7. Sprint Retrospective

A valle delle considerazioni emerse durante il meeting di review, il team ha identificato i seguenti comportamenti da continuare, evitare e migliorare nel prossimo sprint:

Start	More of	Keep doing	Less of	Stop
Sessioni di demo intermedie durante lo sprint per validare le funzionalità implementate prima della review finale.	Confronto proattivo sulla qualità del codice e sulla coerenza architetturale tra i membri del team.	Disponibilità immediata tra i membri del team in caso di blocchi tecnici.	Attesa passiva prima di segnalare un blocco o una dipendenza non prevista.	Iniziare lo sviluppo di un task senza aver verificato le dipendenze con altri task già in corso.
		Continuare con la decomposizione atomica dei task avviata in questa sprint, che si è rivelata efficace nel prevenire le problematiche della Sprint 1.		
		Ritmi di lavoro costanti e produttivi mantenuti per tutta la durata dello sprint.		

8 Prossimo Sprint — Pianificazione Preliminare

Obiettivo del prossimo Sprint

Migliorare l'esperienza utente introducendo una gestione avanzata della libreria attraverso ordinamento e tag visivi. Finalizzare e revisionare il Documento di Progettazione tecnico per allinearlo all'architettura software finale e riflettere accuratamente tutte le funzionalità sviluppate nel corso del progetto.
