

VibeFlow

Sprint 3: Review & Retrospective Report

Sprint 3: 11 Giugno – 18 Giugno 2026

Gruppo 6

Autorino Luigi

Chirico Emanuel

Crisci Chiara

Graziuso Emanuela

Prof. Andrea Apicella

Prof. Pierluigi Ritrovato

1. Informazioni Sprint

Campo	Dettaglio
Progetto	VibeFlow
Sprint N°	3
Data inizio	11/06/2026
Data fine	18/06/2026
Team	Autorino Luigi, Chirico Emanuel, Crisci Chiara, Graziuso Emanuela
Professori	Apicella Andrea, Ritrovato Pierluigi

2. Sprint Goal

Migliorare l'esperienza utente introducendo una gestione avanzata della libreria attraverso ordinamento e tag visivi. Finalizzare e revisionare il Documento di Progettazione tecnico per allinearlo all'architettura software finale e riflettere accuratamente tutte le funzionalità sviluppate nel corso del progetto.

3. User Stories — Stato al termine dello Sprint


ID_US	Task	Assegnatario	Data inizio	Data fine prevista	Data fine	Priorità	Stato	Story points
Sprint 3								
ID_18	Playlist MostPlayed	Chirico Emanuel	13/6	16/6	15/6	Medium	Completed	3
ID_19	Playlist Genre	Graziuso Emanuela	12/6	14/6	14/6	Medium	Completed	3
ID_20	Playlist Year	Graziuso Emanuela	14/6	15/6	14/6	Medium	Completed	3
ID_21	Assegna Tag Visivi	Crisci Chiara	12/6	15/6	14/6	Medium	Completed	2
ID_22	Playlist Tag Visivi	Crisci Chiara	14/6	16/6	15/6	Medium	Completed	3
ID_23	Riordina Brani Playlist	Autorino Luigi	14/6	16/6	14/6	Low	Completed	3

4. Sprint Burndown Chart

Il burndown chart della Sprint 3 mostra un andamento complessivamente positivo, con il completamento di tutti i 17 Story Points previsti entro il giorno 4. I primi due giorni registrano un avanzamento nullo, riflettendo una scelta deliberata del team: a seguito del planning iniziale, si è deciso di concentrare il lavoro nella seconda parte dello sprint, consapevoli della disponibilità limitata nelle giornate iniziali. A partire dal giorno 3, il team ha accelerato significativamente, azzerando il backlog residuo entro il giorno 4. Lo sprint si è concluso senza Story Points residui, confermando il pieno raggiungimento dello Sprint Goal.

Sprint 3 Burndown Chart

Giorno	SP Da Completare	SP Pianificati
1	17	17
2	17	17
3	6	14
4	0	9
5	0	0
6	0	0
7	0	0

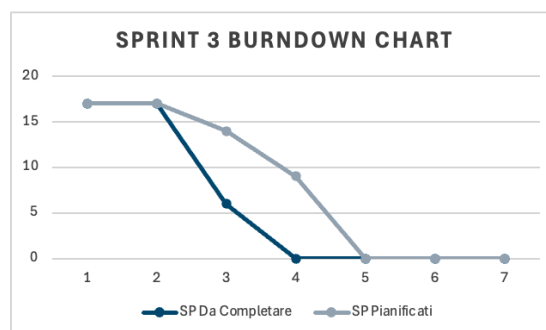

5. Metriche di Sprint

Metrica	Valore Pianificato	Valore Effettivo
Story Points completati	17	17
User Stories completate	6	6/6

Velocity sprint corrente	17	17
Task posticipati (Postponed)	0	0
Story Points posticipati	0	0

La **velocity** effettiva della Sprint 3 (17 SP) risulta inferiore rispetto alla Sprint 2 (39 SP), in linea tuttavia con un backlog più contenuto. Tutti gli obiettivi pianificati sono stati raggiunti senza alcun task posticipato, confermando la capacità del team di adattare la pianificazione alle proprie disponibilità reali e di mantenere un ritmo di lavoro produttivo ed efficace nella finestra temporale disponibile.

6. Sprint Retrospective

A valle delle considerazioni emerse durante il meeting di review, il team ha identificato i seguenti comportamenti da continuare, evitare e migliorare nel prossimo sprint:

Start	More of	Keep doing	Less of	Stop
Documentazione tecnica incrementale in corso d'opera, senza aspettare il completamento di tutte le funzionalità.	Revisione informale del codice tra i membri del team, rivelatasi efficace per la qualità del prodotto e la risoluzione dei bug.	Comunicazione fluida e collaborazione costante tra i membri.	Concentrazione del lavoro nella seconda parte dello sprint.	
	Pianificazione dei task più realistica	Gestione dei task autonoma		
